



PLANO DE MONTAGEM DA PONTE DA CRUZ DAS OLIVEIRAS

Construção de Viaduto Ciclo - Pedonal da Cruz das Oliveiras, Lisboa


Índice

1. Plano de trabalhos..... Pág. 3
2. Proposta de desvios / alternativas e condicionalismos..... Pág. 4

1. Plano de trabalhos

A montagem do tabuleiro será realizado em três fases, para cada fase está previsto um dia. Os trabalhos decorrerão entre os dias 17 e 19 de Fevereiro de 2021 de acordo com o cronograma abaixo.

	Fevereiro				20
	16	17	18	19	
Montagem dos Pilares					
Montagem do 1º e do 2º troços					
Montagem do 3º troço					

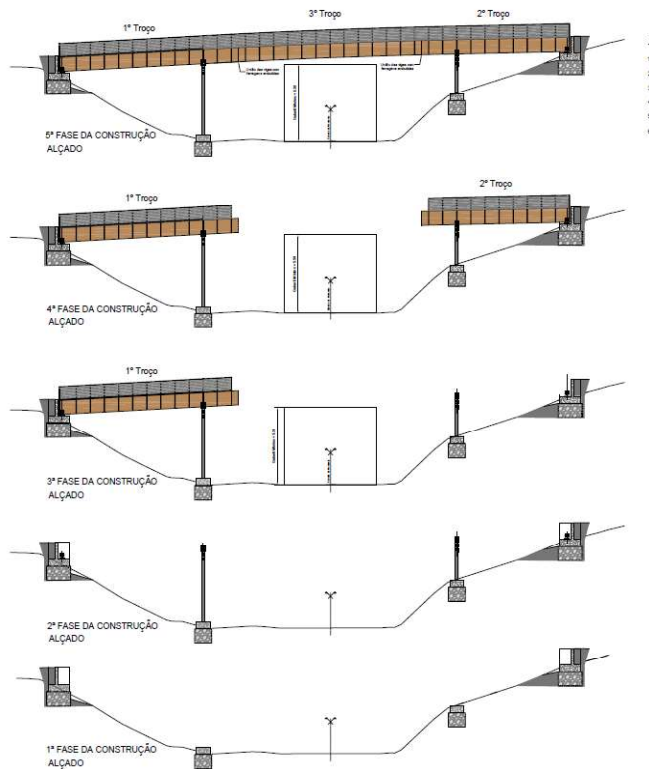

Assim prevê-se o corte total da estrada (faixa de rodagem) durante três dias entre as 8h00 e as 19h00, sendo reaberto o trânsito entre esses horários.

2. Proposta de desvios / alternativas e condicionalismos

Propomos o corte parcial da Estrada de Monsanto, com início a Sul junto da rotunda de acesso à A5, até ao cruzamento com a Estrada do Forte de Monsanto no sentido Sul – Norte. Assim mantêm-se a circulação normalizada na Estrada do Forte de Monsanto (via de sentido único).

O corte total da Estrada de Monsanto, deverá ser realizado, a Sul, no cruzamento com a Estrada do Forte de Monsanto e a Norte, na rotunda de ligação entre a Estrada de Monsanto e a Estrada do Barcal.

Como via alternativa do corte da Estrada de Monsanto, o trânsito deverá redirecionado para a Estrada das Oliveiras de Baixo que depois ligará à Estrada do Outeiro até à rotunda com a Estrada de Monsanto.

Na figura abaixo represento o esquema de posicionamento e sinalização de trânsito condicionado.

